

Schriftlicher Arbeitsauftrag (Arbeitsvorbereitung für AuS 2 im Niederspannungsnetz)

Damit wird eine Arbeit vorbereitet, bei der Personen mit Körperteilen, Werkzeugen, Ausrüstungen oder Hilfsmitteln blanke unter Spannung stehende Teile berühren oder in die Gefahrenzone eindringen (Gefahrenzone im NS-Netz = Berührung). Die Arbeit ist vorgängig gem. T 06.0 zu planen.

Arbeitsauftrag:

Arbeitsort, Projektname: (Objekt, Strasse, nähere Bezeichnung)

Tätigkeitsbereich

Unterstützend zur beschriebenen Tätigkeit gelten die markierten Arbeitsanweisungen (AA) auf der Rückseite.

Instruktion erteilt (Ressortleiter sgs w)

Name:

Unterschrift:

Tel./Natel:

Instruktion erhalten (Arbeitsverantwortlicher (ABV))

Name:

Unterschrift:

Tel./Natel:

Arbeitsstelle vor Ort:

- ⇒ Der schriftliche Arbeitsauftrag wurde besprochen und dem Arbeitsverantwortlichen (ABV) übergeben (Unterschrift)
- ⇒ Die physische und psychische Verfassung aller beteiligten Personen sind so, dass die Arbeiten sicher und korrekt durchgeführt werden können
- ⇒ Es ist genügend Platz vorhanden, damit die Arbeiten sicher ausgeführt werden können
- ⇒ Sicherer Standort ist gewährleistet
- ⇒ Die Beleuchtung ist ausreichend (Notbeleuchtung, Taschenlampe)
- ⇒ Die Fluchtwege sind bekannt und frei
- ⇒ Der Schutz gegen Umwelteinflüsse (Witterung, Schmutz, Ablenkung, Passanten usw.) ist gewährleistet

Spezielles: (Wetter, Jahreszeit, Abgrenzung, Abschrankungen usw.)

Notausschaltstelle: (Schaltstelle wurde vorgängig durch das Arbeitsteam angeschaut und markiert)

Bezeichnung:

Termin:

Datum:

Uhrzeit:

Ungefähre Dauer:

≤ ½ Tag, > ½ Tag

Vor Arbeitsbeginn:

- ⇒ Schutzkleidung geschlossen, Helm mit Visier, Unterziehhandschuhe (Kevlar) und Isolierhandschuhe
- ⇒ Metallische Teile (Wasser- und Gasleitungen, Zorreseisen usw.) sind abgedeckt
- ⇒ Werkzeug ist für AuS geeignet
- ⇒ Metallener Schmuck (Uhr, Ring, Kette usw.) ist abgelegt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln:

- ⇒ AuS 2 wird nur von speziell dafür ausgebildeten Mitarbeitenden ausgeführt → Schulung und Vereinbarung
- ⇒ Das Material muss dem erforderlichen Personal für AuS vertraut sein
- ⇒ Nur zugelassene Geräte, Hilfsmittel, Isoliermaterial und persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden
- ⇒ Vor Gebrauch Sichtprüfung auf Mängel
- ⇒ Bei Arbeitsunterbruch muss die Arbeitsstelle gegen mögliche Gefährdungen in Bezug auf Personen-, Anlage- und Versorgungssicherheit gesichert werden (Absperrungen, Abdeckungen, Kennzeichnungen, Beschriftungen u.a.)
- ⇒ Vor Wiederaufnahme der Arbeiten muss die Arbeitsstelle auf mögliche Veränderungen der Gegebenheiten überprüft werden.



Arbeiten wurden korrekt ausgeführt

Arbeitsverantwortlicher (ABV) [sachverständig]

Name:

Unterschrift:

Datum:

Tel./Natel:

Arbeiten wurden korrekt ausgeführt

Zweite Person [mind. instruiert]

Name:

Unterschrift:

Datum:

Checkliste vor Ort (Arbeiten unter Spannung AuS 2 im NS-Netz)

Für jede Tätigkeit (Arbeiten unter Spannung AuS 2 im NS-Netz) wird eine schriftliche Checkliste vor Ort ausgefüllt. Der schriftliche Arbeitsauftrag wurde vorgängig besprochen und unterschrieben. Am Abend oder nach Beendigung der Arbeit wird die Checkliste dem Ressortleiter sgs w abgegeben.

Projekt:	
Arbeitsvorbereitung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
Notschaltstelle ist festgelegt (Schaltstelle wurde vorgängig durch das Arbeitsteam besichtigt und markiert) Bezeichnung:	
Es ist genügend Platz vorhanden, damit die Arbeiten sicher ausgeführt werden können	
Der Schutz gegen Umwelteinflüsse (Montagezelt, Witterung, Schmutz, Ablenkung, Passanten usw.) ist gewährleistet	
Metallische Teile (Wasser- und Gasleitungen, Zorreseisen usw.) sind abgedeckt	
Die persönliche Schutzausrüstung (PSA), das Sicherheitswerkzeug, die Hilfsmittel und das Einsatzmaterial sind in einem einwandfreien und kompletten Zustand (Sichtprüfung auf Mängel)	
Termin Datum: ungefähre Dauer: Uhrzeit: <input type="checkbox"/> ≤½ Tag, <input type="checkbox"/> >½Tag	
Metallener Schmuck (Uhr, Ring, Kette usw.) ist abgelegt	
2 unabhängige Isoliermassnahmen (2 Schutzbarrieren) sind vorhanden!	
Arbeit ausführen	

Arbeitsverantwortlicher (ABV) [sachverständig]

Name:
Unternehmen/Abt:
Datum:
Unterschrift:


Zweite Person [mind. instruiert]

Name:
Unternehmen/Abt:
Datum:
Unterschrift:

↪ Checkliste liegt auf der Baustelle auf

Schriftlicher Arbeitsauftrag (Arbeitsvorbereitung für komplexe Arbeiten im NS-Netz)

Gemäss EN 50110-1 gilt: „Für komplexe Arbeiten muss diese Vorbereitung schriftlich und rechtzeitig vorher erfolgen“. Diese Arbeiten sind bei den sgsw vorgängig gem. T 06.0 zu planen. Bei den sgsw werden darunter folgende Tätigkeiten verstanden:

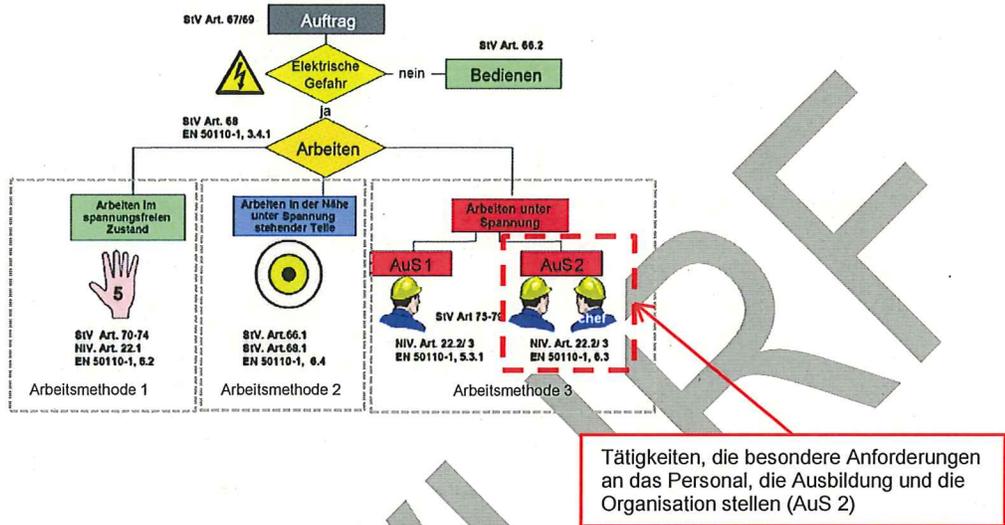

Grundsatz:

Wenn immer möglich sollen Arbeiten unter Spannung (Arbeitsmethode 3) vermieden werden.

Auftrag:

Projekt:

.....

Tätigkeitsbereich (unmissverständliche Umschreibung):

.....

Arbeitsausführung:

Arbeiten unter Spannung AuS 2 im NS-Netz ohne Einschränkungen zugelassen
 Arbeiten unter Spannung AuS 2 im NS-Netz mit folgenden Einschränkungen zugelassen:

Beilagen zum Arbeitsauftrag:

Schema Kundenliste Planunterlagen
 Checkliste AuS 2 NS-Netz

Instruktion erteilt (Ressortleiter sgsw)

Name:
 Unternehmen/Abt:
 Datum:
 Unterschrift

Instruktion erhalten (Arbeitsverantwortlicher [ABV])

Name:
 Unternehmen/Abt:
 Datum:
 Unterschrift:
